

COMPLEJO DEPORTIVO COMUNAL DE PUTRE
ETAPA I

BIP – 400031680
SECPLAN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE

PLAN MAESTRO DEPORTIVO

Infraestructura deportiva y urbana asociada

6.624 m²
CANCHA FIFA
césped artificial

4
ANDARIVELES
pista atlética de 1,22 m

433
GRADERÍAS
espectadores

100%
ACCESIBILIDAD
pasillos y acceso universal



- Camarines y servicios higiénicos para público.
- Bodega y oficina administrativa.
- Iluminación de cancha y espacios públicos.
- Áreas verdes, pasaje de acceso y estacionamiento pavimentado.

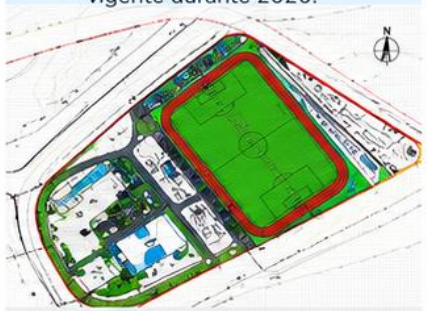

LEYENDA ETAPA I
1 Cancha de fútbol (césped sintético)
2 Pista atlética (4 andariveles)
3 Graderías (433 espectadores)
4 Camarines y servicios higiénicos
5 Multicancha
6 Piscina (cubierta)
7 Plaza de acceso y circulación
8 Áreas verdes y paisajismo
9 Estacionamientos
10 Cierre perimetral
ACCESO PRINCIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | SECOPLAC
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION

COMPLEJO DEPORTIVO COMUNAL DE PUTRE – ETAPA I

1 RECOMENDACIÓN SATISFACTORIA (RS)
2019 – 2020

- Formulación del proyecto.
- Estudios preliminares y levantamiento de terreno.
- Evaluación técnica Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
- Pronunciamiento favorable del IND.
- Obtención de RS en 2019, vigente durante 2020.



PLAN MAESTRO – ETAPA I
PLANO DE EMPLAZAMIENTO

2 LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN
2021

- Publicación de la licitación pública.
- Presentación de ofertas.
- Evaluación técnica y económica.
- Adjudicación del contrato de obra.



PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN

3 EJECUCIÓN Y TÉRMINO ANTICIPADO
2022 – 2023

- Inicio de obras en 2022.
- Construcción de cancha, pista atlética, graderías, camarines y obras exteriores.
- Término anticipado en 2023 debido a dificultades técnicas y administrativas.



OBRAS EN EJECUCIÓN
(2022)
VISTA GENERAL

4 PRIMERA REEVALUACIÓN
2023

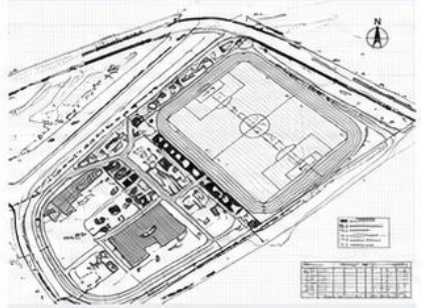
- Análisis de avance físico y financiero.
- Actualización de costos.
- Revisión de partidas y condiciones de mercado.
- Ajustes de diseño y obras complementarias.
- Validación de la continuidad del proyecto.



ESTADO DEL PROYECTO TRAS AJUSTES (2023)
CANCHA Y PISTA ATLÉTICA

5 SEGUNDA RECOMENDACIÓN SATISFACTORIA (RS)
2026

- Segunda reevaluación del proyecto.
- Actualización de presupuesto y análisis técnico-económico.
- Incorporación de ajustes y obras complementarias.
- Obtención de una nueva RS en 2026, que permite su continuidad hacia la próxima etapa de ejecución.



PLANO ACTUALIZADO – 2026
EMPLAZAMIENTO GENERAL

6 SITUACIÓN ACTUAL Y PRÓXIMOS PASOS
2026 – EN ADELANTE

- Proyecto con segunda RS obtenida.
- En proceso de programación presupuestaria.
- Coordinación con el municipio y organismos competentes.
- Programación de equipamiento y habilitación.
- Próxima etapa de ejecución para su puesta en operación y uso de la comunidad.



PROYECTO ACTUALIZADO
VISTA AÉREA REFERENCIAL

2019 – 2020
ESTUDIOS Y RS (VIGENTE 2020)
→
2021
LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN
→
2022 – 2023
EJECUCIÓN Y TÉRMINO ANTICIPADO
→
2023
PRIMERA REEVALUACIÓN
→
2026
SEGUNDA RS (PROYECTO ACTUALIZADO)
→
2026 – EN ADELANTE
NUEVA LICITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN

ESTRUCTURA DE INVERSIÓN

Montos oficiales de la Ficha IDI 2026

$5.774,6 MM
OBRAS CIVILES
97,3% del costo total

$135,1 MM
CONSULTORÍAS
M$ 135.054

$20,8 MM
EQUIPOS
M$ 20.766

$5,0 MM
GASTOS ADM.
M$ 5.023



SITUACIÓN TÉCNICA ACTUAL

La reevaluación cuenta con recomendación favorable

RS

RECOMENDADO SATISFACTORIAMENTE

01 JULIO 2026

- La reevaluación fue recomendada favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
- Pronunciamiento técnico favorable del Instituto Nacional del Deporte: Ord. AP-00195/2026, de 12 de junio de 2026.
- La Municipalidad de Putre actúa como institución formuladora y técnica.
- El Gobierno Regional de Arica y Parinacota es la institución financiera.

3.560 m s. n. m.

LOCALIZACIÓN

Putre

132 km

DESDE ARICA

localidad de Putre

PROYECTO ESTRATÉGICO PARA PUTRE

- Putre carece de infraestructura deportiva adecuada para una práctica generalizada y masiva.
- La iniciativa busca ampliar las posibilidades de actividades y competencias deportivas y recreativas para distintos grupos etarios.
- El área de influencia considera una comuna territorialmente dispersa: aproximadamente 14 poblados y 100 caseríos o estancias.
- El proyecto se emplaza en la entrada de Putre, junto a la Ruta A-147, en el terreno de la actual cancha municipal.



INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA UNA COMUNA DE ALTA MONTAÑA
