GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 2027

Partida 31 · Gobierno Regional de Ñuble

Prioridades, cartera de inversión y propuestas para mejorar la ejecución 2027

9 de octubre de 2026

Contenido

01 **Síntesis**
Cifras clave del Gobierno Regional para 2027

02 **Evolución del gasto y ejecución**
Presupuesto de inversión 2021–2027 y cumplimiento anual

03 **Prioridades regionales 2026 y foco 2027**
Cinco ejes estratégicos vinculados a la cartera

04 **Principales iniciativas en ejecución**
Cinco obras emblemáticas: costo, avance y término

05 **Uso de fondos condicionados**
FNDR, Cultura, FRPD y FATPCR

06 **Obstáculos y propuestas**
Nudos de ejecución y solicitudes para 2027

07 **Anexos**
Arrastre 2027 y convenios de programación

Síntesis: lo que Ñuble lleva a la discusión 2027

$ 24.253 millones

arrastre 2027 de 15 iniciativas de inversión en ejecución

$ 116.979 millones

compromiso GORE en 4 convenios de programación vigentes (MOP, MINSAL, CORFO, PDI)

78 %


de los fondos condicionados vigentes ya distribuidos a iniciativas ($ 73.785 de $ 94.441 millones)

5

obras emblemáticas con término entre dic-2026 y jun-2027: salud, educación superior y bomberos

Montos en millones de pesos; tablas de respaldo en miles de pesos (M$) según anexos N°1 y N°2 y estado de fondos condicionados. Fuente: GORE Ñuble, DAF/DIPIR, octubre 2026.

Presupuesto de inversión regional 2021–2027

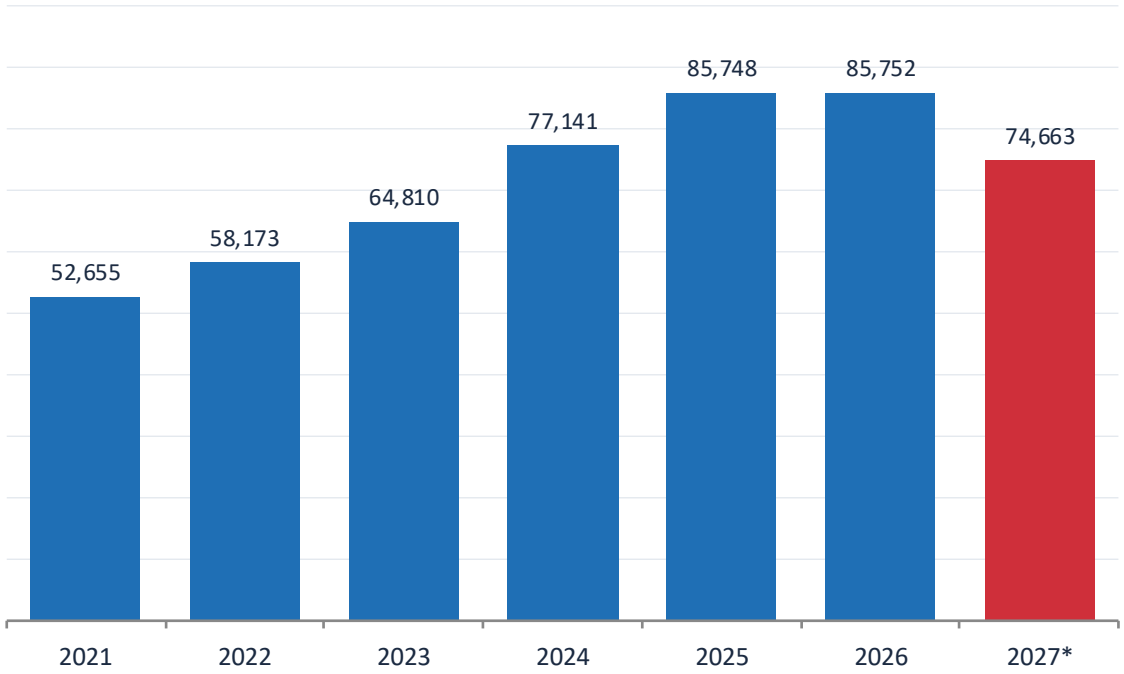

*Presupuesto inicial de inversión, millones de pesos. * Propuesta 2027 en valor real (descuenta inflación proyectada de 4,1 %).*

Fuente: Leyes de Presupuestos 2021 a 2026 y Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 (Partida 31, GORE Ñuble).

+ 63 %

creció el presupuesto de inversión entre 2021 y 2026: de $ 52.655 a $ 85.752 millones, con alza todos los años


2027: primera caída

la propuesta deja $ 74.663 millones en valor real, por debajo del nivel de 2024

– $ 11.000 millones

de inversión para Ñuble en 2027: es la plata que cada año se destina a obras y programas en las 21 comunas

Ejecución presupuestaria 2021–2025

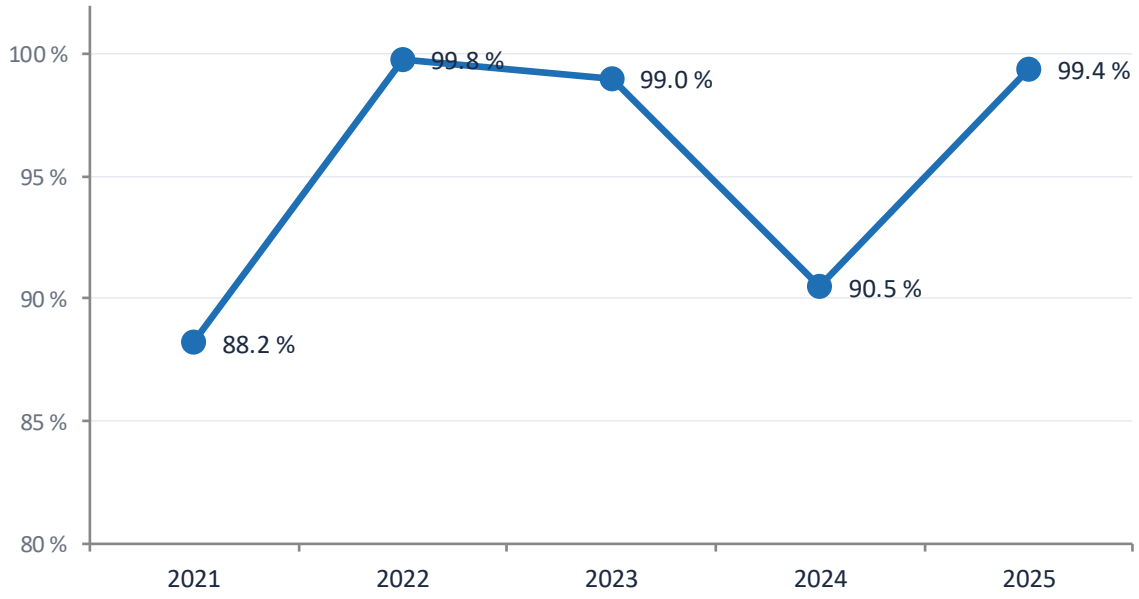

2021: El nuevo equipo del Gobierno Regional asumió en julio.

2024: Lenta tramitación de nivel central por el caso fundaciones.

3 de 5 años

con más del 99 % del presupuesto ejecutado: casi todo lo que recibimos, lo invertimos

99,4 %

ejecución 2025: 3er lugar nacional, con un promedio país de 94,2 % (balance DIPRES)

94 de cada 100 pesos

van a obras y programas para las personas

Porcentaje del presupuesto ejecutado cada año. Fuente: Cuentas Públicas GORE Ñuble 2022 a 2025 y Ley de Presupuestos 2026; balance DIPRES 2025.

Prioridades regionales 2026 y foco 2027

1. Reconstrucción y gestión del riesgo

Plan de reconstrucción post incendios de enero 2026 presentado a Hacienda; respuesta a sistemas frontales; Centro Integrado de Emergencias y Seguridad (CIES)

2. Salud, educación y cuidados

Convenio de Programación GORE–MINSAL; Instituto Teletón Ñuble; CESFAM Pinto; Escuela de Medicina y laboratorios UBB; Liceo A-17 Yungay; Hogar de Ancianos San Ignacio.

3. Agua, saneamiento y habitabilidad rural

Alcantarillado y PTAS San Fabián; sistema colectivo San Miguel; redes de agua potable y aguas servidas en Ninhue y Bulnes.

4. Seguridad y resiliencia territorial

Red de televigilancia (209 cámaras en 21 comunas); cuarteles de Bomberos en Chillán y Trehuaco; Convenio de Programación con la PDI.

5. Desarrollo productivo, conectividad y empleo

FRPD y Convenio CORFO para Mipymes; Convenio de Programación GORE–MOP; FRIL comunal (subtítulo 33); espacios públicos y mercado de Chillán.

Cada eje se vincula a iniciativas concretas de la cartera de inversión regional (anexos N°1 y N°2).

Principales iniciativas en ejecución

Iniciativa	Comuna	Costo total M$	Gasto 2026 M$	Estado de avance	Término estimado	Dificultades
Construcción Instituto de Rehabilitación Infantil Teletón Ñuble	Chillán	14.532.818	7.648.445	100 % obra civil	31-12-2026	Adquisición de equipos y equipamiento
Construcción Escuela de Medicina y Centro de Simulación Clínica UBB	Chillán	14.326.611	5.450.218	65 % obra civil · 18 % equipos	30-06-2027	Adquisición de equipos
Construcción Laboratorios carrera de Química y Farmacia UBB	Chillán	2.611.244	2.241.029	98 % obra civil	30-06-2027	Adquisición de equipos
Reposición Cuartel de Bomberos 5ª Compañía Chillán	Chillán	1.729.634	1.721.943	65 % obra civil	31-01-2027	Retraso en asignación presupuestaria ítem equipos y equipamiento
Reposición Hogar de Ancianos comuna de San Ignacio	San Ignacio	3.441.171	607.595	50 % obra civil	Por definir	Obra paralizada recientemente por observación de cumplimiento normativo

Fuente: DIPIR GORE Ñuble, corte octubre 2026. Montos en M$ (miles de pesos).

Obras emblemáticas en ejecución



Instituto de Rehabilitación Infantil Teletón Ñuble
Chillán · Costo total M$ 14.532.818 · 100 % obra civil · término 31-10-2026



Primera Escuela regional de Medicina (UBB)
Chillán · Costo total M$ 14.326.611 · 65 % obra civil · término 30-06-2027

Fotografías: Gobierno Regional de Ñuble, 2026. Datos según lámina anterior (DIPIR, octubre 2026).

Uso de fondos condicionados

Fondo	Ley Ppto. 2026 M$	Monto vigente M$	Distribuido M$	No distribuido M$	% distr.	Principales iniciativas financiadas
FNDR (y otros)	53.251.259	61.939.465	61.939.465	0	100 %	Instituto Teletón Ñuble; CESFAM Pinto; Escuela de Medicina y Centro de Simulación Clínica UBB
Cultura	881.003	881.003	0	881.003	0 %	Sin distribución a la fecha
FRPD	12.829.611	12.829.611	4.624.260	8.205.351	36 %	Transferencia Reactivación y Transformación Económica de las Mipymes de la Región de Ñuble
FATPCR (ex FAR)	18.790.488	18.790.488	7.221.326	11.569.162	38 %	Aplicación letra a) artículo cuarto transitorio Ley N° 20.378
Total	**85.752.361**	**94.440.567**	**73.785.051**	**20.655.516**	**78 %**	

Nota: la columna "Monto vigente M$" considera modificaciones presupuestarias en tránsito; el total vigente a la fecha es de M$ 80.228.979.

Lectura: el FNDR está distribuido en su totalidad. El saldo no distribuido ($ 20.656 millones) se concentra en FRPD y FATPCR, fondos cuyo uso está acotado por ley y sujeto a visación de DIPRES; ello explica la brecha y fundamenta la solicitud de flexibilidad (lámina 10).

Obstáculos de ejecución

Tiempos de visación de DIPRES

Las iniciativas con cargo al FATPCR (ex FAR) y al FRPD requieren visación previa de DIPRES. La demora de ese trámite retrasa la incorporación de recursos al marco y desplaza la ejecución al año siguiente.

Rigidez de las fuentes de financiamiento

Cada fondo responde a la ley que lo crea. Ello impide reasignar recursos a emergencias y a otras necesidades que la región demanda, reduciendo el margen de acción del Gobierno Regional.

Programas plurianuales con visación anual

Un programa aprobado en septiembre debe esperar la visación de DIPRES para el ejercicio siguiente; el plazo del trámite impide incorporarlo oportunamente en el marco inicial del año.

Efecto común: menor ejecución en el año de aprobación y arrastre innecesario hacia el ejercicio siguiente.

Propuestas para mejorar la ejecución 2027

GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

1 Incorporar el subtítulo 33 en la meta de ejecución presupuestaria

Las transferencias del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) financian obras comunales con impacto directo en empleo local; hoy no se reflejan en la medición de ejecución del GORE.

2 Reconocer el devengo al momento de la transferencia a servicios públicos

Alinea la medición de ejecución con el acto administrativo que compromete los recursos y evita que el avance dependa de la rendición de terceros.

3 Eliminar la visación de DIPRES y la doble tramitación de decretos

Los decretos ya son tomados de razón por la Contraloría General y luego por la Contraloría Regional; la visación adicional de DIPRES duplica el control y extiende los plazos.

4 Flexibilizar el uso del FATPCR (ex FAR) y del FRPD

Permitir destinar estos fondos a otras iniciativas de inversión regional, incluidas emergencias, cuando la cartera elegible esté agotada o no responda a la prioridad del territorio.

Las cuatro medidas apuntan a un mismo objetivo: que la ejecución refleje la decisión regional de invertir y no los tiempos de tramitación central.

Anexo N°1: iniciativas de inversión con arrastre 2027

N°	Código BIP	Iniciativa	Costo total M$	Ejecución 2026 M$	Arrastre 2027 M$	Arrastre años sig. M$
1	20119065	Reposición Hogar de Ancianos, San Ignacio	3.035.638	1.577.384	1.458.254	0
2	30132719	Reposición Edificio Consistorial, El Carmen	3.416.246	0	0	3.416.246
3	30386411	Reposición Liceo A-17, Yungay	6.435.206	31.838	6.402.757	0
4	30459763	Construcción sistema colectivo de aguas servidas, sector San Miguel	3.778.173	879.958	2.148.464	0
5	40010038	Reposición Centro de Salud Familiar, Pinto	6.552.338	3.179.710	1.165.380	0
6	40018349	Ampliación red agua potable, aguas servidas y PEAS, Villa Los Artesanos, Ninhue	1.952.907	846.138	197.872	0
7	40021911	Reposición total Escuela Felipe Cubillos Sigal, Coelemu	538.489	0	538.489	0
8	40028237	Construcción alcantarillado y PTAS, San Fabián de Alico	10.151.936	249.814	3.223.973	6.678.149
9	40029660	Reposición Cuartel Cuerpo de Bomberos, Trehuaco	1.658.357	889.665	768.692	0
10	40047341	Mejoramiento Patio Isabel Riquelme, Mercado Municipal de Chillán	3.359.890	1.910.542	1.449.348	0
11	40055832	Construcción Escuela de Medicina y Centro de Simulación Clínica UBB	11.006.611	5.301.391	5.705.220	0
12	40051823	Conservación Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano, Chillán Viejo	772.252	0	772.252	0
13	40014384	Construcción Parque Intercomunal Ultraestación, Chillán	201.209	0	201.209	0
14	40038229	Construcción alcantarillado y mejoramiento agua potable, Tres Esquinas, Bulnes	202.063	79.634	122.699	0
15	40048792	Mejoramiento espejo de agua e iluminación, mural María Martner, Chillán Viejo	223.989	125.719	98.270	0
		Total (15 iniciativas)	**53.285.304**	**15.071.793**	**24.252.879**	**10.094.395**

Fuente: DIPIR GORE Ñuble, octubre 2026. Se eliminó la columna 'Sector económico', sin datos en la versión original.

Anexo N°2: convenios de programación vigentes

N°	Convenio	Costo total M$	Compromiso sectorial M$	Compromiso GORE M$	Ejecución GORE 2026 M$	Arrastre GORE 2027 M$	Arrastre años sig. GORE M$
1	GORE Ñuble – Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (CORFO)	6.599.000	2.899.000	3.700.000	0	2.000.000	1.700.000
2	GORE Ñuble – Ministerio de Salud	35.207.615	20.864.702	14.342.913	3.393.576	3.500.000	7.449.337
3	GORE Ñuble – Ministerio de Obras Públicas	298.736.983	206.626.861	92.110.122	0	1.500.000	90.610.122
4	GORE Ñuble – Policía de Investigaciones de Chile	34.515.602	27.690.000	6.825.602	0	0	6.825.602
	Total	**375.059.200**	**258.080.563**	**116.978.637**	**3.393.576**	**7.000.000**	**106.585.061**

Lectura: el compromiso GORE en convenios suma $ 116.979 millones; el 79 % corresponde al convenio con el MOP, cuyo arrastre se concentra en años posteriores a 2027. Solo el convenio MINSAL registra ejecución GORE en 2026.

Fuente: DIPLADE/DAF GORE Ñuble, octubre 2026.
