
GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Proyecto de Ley de Presupuesto Año 2027



PRIORIDADES REGIONALES 2026 Y FOCO 2027



PRINCIPALES INICIATIVAS EN EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA INICIATIVA

REPOSICIÓN LICEO POLITÉCNICO C-20, TALTAL

Costo Total M$	Gasto al 2026 en M$	Avance	Comuna
29.907.625	7.618.341	30%	TALTAL

Dificultades

Este proyecto tuvo 3 licitaciones por falta de oferentes, lo cual incidió en el costo final, que resultó ser el doble del valor proyectado.

Debido a la lejanía de Taltal respecto de los centros urbanos más importantes de la región, se dificultan los costos y la logística. Además, se considera una demolición que implica la disposición de los desechos, y la comuna no cuenta con vertedero.

Fecha de Término: 21/07/2027

PRINCIPALES INICIATIVAS EN EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA INICIATIVA

PROGRAMA PARA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES POR EFECTOS CLIMÁTICOS

Costo Total M$	Gasto al 2026 en M$	Avance	Comuna
5.578.769	1.884.230	34%	Intercomunal

Dificultades

Este es un programa propio, elaborado para enfrentar las situaciones climáticas y que nos permitió enfrentar la emergencia en el mes de agosto en forma expedita.

Al ser un programa propio, la principal dificultad radica en el número de iteraciones que resultan en la Dipres para su aprobación.

Fecha de Término: 03/08/2027

PRINCIPALES INICIATIVAS EN EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA INICIATIVA

CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO ESCOLAR CORVALLIS



Costo Total M$	Gasto al 2026 en M$	Avance	Comuna
9.055.596	4.972.552	60%	ANTOF.

Dificultades

Contrato inicial fue liquidado por abandono del contratista y, además, fue objeto de vandalizacion mientras ello ocurría. Se tuvo que realizar un nuevo contrato para retomar las obras.

Fecha de Término: 30/05/2027

PRINCIPALES INICIATIVAS EN EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA INICIATIVA

AMPLIACIÓN MOLO DE ABRIGO PRINCIPAL PUERTO ANTOFAGASTA



Costo Total M$	Gasto al 2026 en M$	Avance	Comuna
8.665.035	644.827	12%	ANTOF.

Dificultades

Este proyecto es parte del convenio de programación celebrado en el año 2025 con la Empresa Portuaria de Antofagasta. Siendo el CP una buena herramienta por la celeridad en la ejecución, además de comprender proyectos estratégicos para la región.

La dificultad es la exclusión de la Partida 50, lo cual no nos permite seguir con otros proyectos involucrados en este Convenio.

Fecha de Término: 25/01/2029

PRINCIPALES INICIATIVAS EN EJECUCIÓN

NOMBRE INICIATIVA

BECAS EN CAPITAL HUMANO



COSTO TOTAL M$	GASTO AL 2026 EN M$	AVANCE	COMUNA
5.718.698	2.703.952	20%	REGIONAL

DIFICULTADES

Existen 21 Programas de Becas en ejecución con Becas en Magister, Doctorados y lo relevante para la Región formación de especialistas médicos, como también de enfermeras en oncología. Las dificultades están dadas principalmente por ser pioneros y tramitación con las Universidades.

FECHA DE TÉRMINO

30/12/2029

PRINCIPALES INICIATIVAS EN EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA INICIATIVA

MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA TRAMO 1



COSTO TOTAL M$	GASTO AL 2026 EN M$	AVANCE	COMUNA
67.000.000	0	0%	REGIONAL

DIFICULTADES

Reposición del pavimento entre el km 0 y el km 33,171, dividido para su licitación en los tramos 1A (km 0–15) y 1B (km 15–33,171). Considera, además, el mejoramiento geométrico de sectores puntuales, bermas, movimientos de tierra, taludes, drenaje, obras de arte y seguridad vial, con el objeto de adecuar la ruta a los estándares técnicos. Las mayores dificultades se presentan en la serie de tramitaciones que requiere un proyecto de esta naturaleza. Su inicio se encuentra estimado para enero de 2027.

Fecha de Término: 30/04/2028

USO DE FONDOS CONDICIONADOS

Fondo	Ppto. Vigente M$	Monto Distribuido M$	Monto sin Distribución M$
CULTURA	1.340.119	1.340.119	–
FNDR	74.808.543	70.219.282	4.589.261
FRPD	10.448.270	10.448.270	–
FAR	20.880.832	17.080.832	3.800.000
TOTAL	**107.477.764**	**99.088.503**	**8.389.261**

FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL DESARROLLO (FRPD)

NOMBRE INICIATIVA	
DOMOLIF	Saneamiento bioproducto para biorremediación de suelos con combustibles en Antofagasta.
DOMOLIF SPA	Control biotecnología para abatimiento de metano en rellenos y vertederos en Antofagasta.
RUDANACBIOTEC	Recuperación renova mining tm: transformando desechos mineros en riqueza y oportunidad.
Fundación Ciencia Traslacional	Prevención innovación en vacunas y diagnóstico de cáncer e infecciones en Antofagasta.
CINNDA	Control monitoreo y alerta temprana para optimización de desalación en Antofagasta.

USO DE FONDOS CONDICIONADOS

FATPCR

	NOMBRE INICIATIVA
1	CONVENIO DE TRANSPORTE CON MTT
2	RENOVACION DE MICROBUSES Y TAXIS COLECTIVOS

USO DE FONDOS CONDICIONADOS

FONDO CULTURA

NOMBRE INICIATIVA
PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE ARTES VISUALES DE TALENTO JOVEN DE ENSEÑANZA MEDIA DE LA REGION DE ANTOFAGASTA Y DIPLOMADO EN CURADURIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA BIENAL SACO 2026
FESTIVAL DE COLECTIVIDADES EXTRANJERAS DE ANTOFAGASTA 2026
DIVULGACIÓN CIENTIFICA DE ASTRONOMÍA, ARQUEO ASTRONOMÍA Y ETNO ASTRONOMÍA DE SABERES ANCESTRALES INDÍGENAS

PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

GLOSAS	AÑO 2026 (M$2027)	AÑO 2027 (M$2027)	Variación	% Variación
Gastos en Personal	5.993.614	7.455.009 **	1.461.395	24,38%
Dotación máxima de vehículos	5	5	0	0,00%
Dotación máxima de personal	133	151	18	13,53%
Convenios con personas naturales: N°	6	6	0	0,00%
Convenios con personas naturales: monto	174.299	179.319 *	5.020	2,88%
Asignación por funciones críticas: N°	3	3	0	0,00%
Asignación por funciones críticas: monto	39.290	40.422 *	1.132	2,88%
Horas extraordinarias año	12.906	13.278 *	372	2,88%
Autorización máxima en viáticos en el país	49.502	50.928 *	1.426	2,88%
Autorización máxima de viáticos en el exterior	13.680	13.680	0	0,00%
Capacitación y Perfeccionamiento	12.279	12.001	-278	-2,26%
Publicidad	85.799	83.856	-1.943	-2,26%

Nota:

- * Montos 2026 (M$2027) considera reajuste 2026 2% enero a mayo y 1,4% junio a Diciembre
- ** Monto 2027 considera un inflactor de 2,88% adicional un incremento por dotación

PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

Gore Servicio

- Dedicado a Administrar
- Trabaja con servicios públicos

Gore Ejecutor

- Es Unidad Técnica.
- Elabora y ejecuta Programas Propios

OBSTÁCULOS DE EJECUCIÓN

1 Programaciones de gastos no cumplidas por los servicios sectoriales.

Ejemplos:

	Programado	Ejecutado
SERVIU	MM$ 20.000	MM$ 864
DPR	MM$ 11.000	MM$ 0
Vialidad	MM$ 25.500	MM$ 0
Salud	MM$ 9.000	MM$ 2.000

2 Licitaciones desiertas,

asociadas a mayores costos de la región, que no reconoce el nivel central.



Ejemplos:

- **Caminos** Precio por Km
- **Edificación en Salud** MT2

3 Pocos contratistas en la región

que puedan enfrentar contratos grandes.



4 Restricciones al FATPCR

sin conversar con la Contraloría, la cual solicita más claridad en la identificación de proyectos que son parte de transporte, es decir no existe claridad en qué se puede gastar.



5 Cambios en los criterios de la Contraloría Regional,

solicitando información que no se requería anteriormente.



6 Demora en la tramitación de los permisos

en los servicios a nivel central.



SOLICITUDES O PROPUESTAS PARA MEJORAR EJECUCIÓN 2027










SOLICITUDES O PROPUESTAS PARA MEJORAR EJECUCIÓN 2027







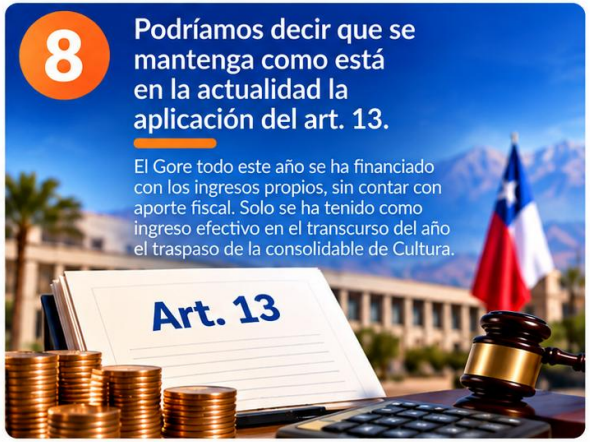

GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Proyecto de ley de Presupuesto año 2027



Anexo N°1:
Nómina completa de iniciativas de Inversión que generan arrastre 2027

- Se adjunta listado en PDF archivo anexo:

N° Iniciativas	Costo Total M$	Gasto 2026 M$	Arrastre 2027 M$	Arrastre Años siguientes M$
275	779.696.625	81.508.010	116.369.635	522.837.631

Anexo N°2:
Convenios de Programación Vigentes

N°	Convenio Vigente	Costo Total M$	Compromiso Sectorial M$	Compromiso GORE M$	Ejecución GORE 2026 M$	Arrastre GORE 2027 M$	Arrastre años siguientes GORE M$
1	Reposición de Infraestructura y de vehículos para Carabineros en la región de Antofagasta 2021-2028	52.708.813	32.503.226	20.205.587	2.317.534	5.416.287	12.471.766
2	Conservación Red Vial, Región de Antofagasta 2020-2026	158.100.900	91.852.185	66.248.715	1.743.605	8.449.735	56.055.375
3	**Mejoramiento y Modernización Poderes de compra región de Antofagasta para Fortalecer la Pequeña Minería de la Región.**	**59.444**	**29.818**	**29.626**	**0**	**4.398**	**25.228**
4	**Obras para potenciar Corredor Bioceánico Capricornio – Región de Antofagasta 2025-2035**	**595.121.705**	**338.802.929**	**256.318.776**	**0**	**34.433.836**	**221.884.940**
5	Ampliación de la oferta Portuaria para el Cumplimiento de Tratados Internacionales con Paraguay y Bolivia, y captura de demanda de carga por Corredor Bioceánico Capricornio	94.375.000	49.075.000	45.300.000	644.827	15.660.731	28.994.442

Anexo N°2:
Convenios de Transferencias

N°	Convenio Vigente	Costo Total M$	Compromiso Sectorial M$	Compromiso GORE M$	Programado 2026 M$	Ejecución GORE 2026 M$	Arrastre GORE 2027 M$	Arrastre años siguientes GORE M$
1	Transferencia convenio Más Viviendas Mejor Región, GORE SERVIU región Antofagasta	444.296.396	355.300.505	88.995.891	20.000.000	864.145	20.041.209	68.090.537
2	Transferencia Convenio Conservación de Vías Urbanas 2025-2035, GORE - SERVIU	88.219.510	0	88.219.510	8.631.451	1.124.000	8.630.000	78.465.510
